



ข้อมูลรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

โดย
นายสรวิศ ตาชูชาติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๖๕๒

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดต่อและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	การติดตามประประเมินผล	๙
	-จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
	-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณงบปี ๒๕๖๗	๑๓
	-ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	๑๖
	-รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	๑๘
	-ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๘
	-โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๗	๒๙
	-รายการแสดงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๗	๓๐
	-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔๐
ส่วนที่ ๓	-ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๒
ส่วนที่ ๔	-สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๙
	-ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนรัง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.โนนรัง

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนนรังหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

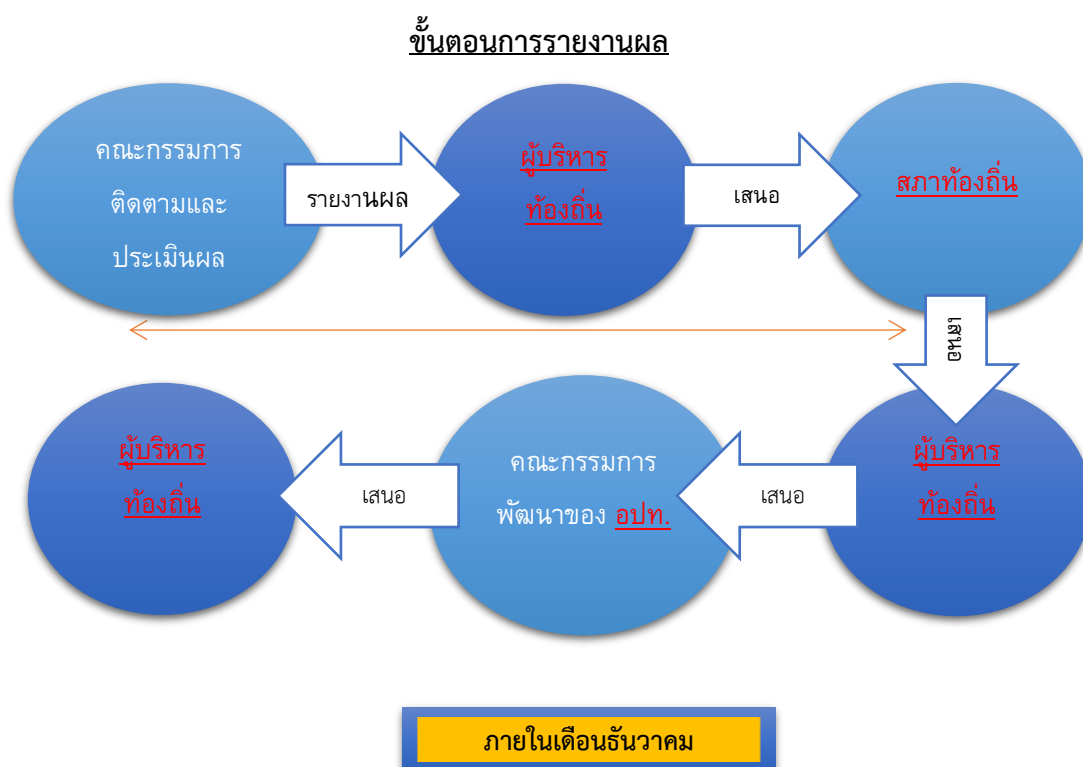

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรัง ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพวงและแผนชุมชนตำบล รายละเอียดดังนี้

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

“องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน”

๒.ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๓.พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ควบคุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔. พัฒนา ส่งเสริมการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

พันธกิจที่ ๕. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

พันธกิจที่ ๖. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

พันธกิจที่ ๗. ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจที่ ๘. เสริมสร้างอาชีพ รายได้ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
 พันธกิจที่ ๑๐. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 พันธกิจที่ ๑๑. ดำเนินการ ด้านจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
 และดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ
 พันธกิจที่ ๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจที่ ๑๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณา
 การ

พันธกิจที่ ๑๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม
 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง

พันธกิจที่ ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๑. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีน้ำในการอุปโภค
 บริโภคและการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
 รายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ ๓. พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สืบสาน
 วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

เป้าประสงค์ที่ ๕. จัดการด้านสวัสดิการสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้พิการ

เป้าประสงค์ที่ ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วม
 ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

เป้าประสงค์ที่ ๗. ดำเนินการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
 และดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วน
 ร่วมเชิงบูรณาการ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๒,๔๖๓,๒๒๔.๘๘ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๓	๔๒,๙๒๓,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๕	๘,๔๔๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๒๑	๑๐,๔๒๒,๐๒๔.๘๘
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๙	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๒๓	๒๐,๗๐๐,๒๐๐.๐๐
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๓,๖๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๕	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๒๑	๓,๒๓๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๓๗	๙๒,๔๖๓,๒๒๔.๘๘

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๒,๔๖๓,๒๒๔.๘๘ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๖๕,๐๐๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๕,๔๕๖,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๗	๑,๓๓๔,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๕,๘๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๑,๑๙๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๙	๘๑๗,๐๐๐
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๕๒๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๔	๑,๓๓๓,๐๐๐
รวม	๙๒	๑๖,๕๖๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๓	๔๒,๙๒๓,๐๐๐	๒๘	๕,๔๕๖,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร	แผนงานการเกษตร	๑๕	๘,๔๔๕,๐๐๐	๗	๑,๓๓๔,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ	แผนงานการศึกษา	๒๑	๑๐,๔๒๒,๐๒๔.๘๘	๑๐	๕,๗๗๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑๔	๑,๑๙๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	แผนงานสวัสดิการสังคม	๒๓	๒๐,๗๐๐,๒๐๐	๙	๘๑๗,๐๐๐
๖.การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๒๐	๓,๖๙๐,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐
๗.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๕	๑,๔๓๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐
๘.การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๑	๓,๒๓๓,๐๐๐	๑๔	๑,๓๓๓,๐๐๐
รวม		๒๓๗	๙๒,๔๖๓,๒๒๔.๘๘	๙๒	๑๖,๕๖๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๒,๙๒๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๑๐๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๔๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๓๙๗,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๘ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘,๔๔๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๘,๔๔๕,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๑๑๑,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๔๒๒,๐๒๔.๘๘ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๑๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๒๙๒,๐๒๔.๘๘ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๒๒,๐๒๔.๘๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๑๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๕ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๗๐๐,๒๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๒๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๙๐๐,๒๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๘๓,๒๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๒๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๙๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๓๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๓๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร


-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ


- การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทักษะคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก เนื่องจากปริมาณเด็กที่เข้าเกณฑ์การได้รับการศึกษามีจำนวนที่มากขึ้น

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗

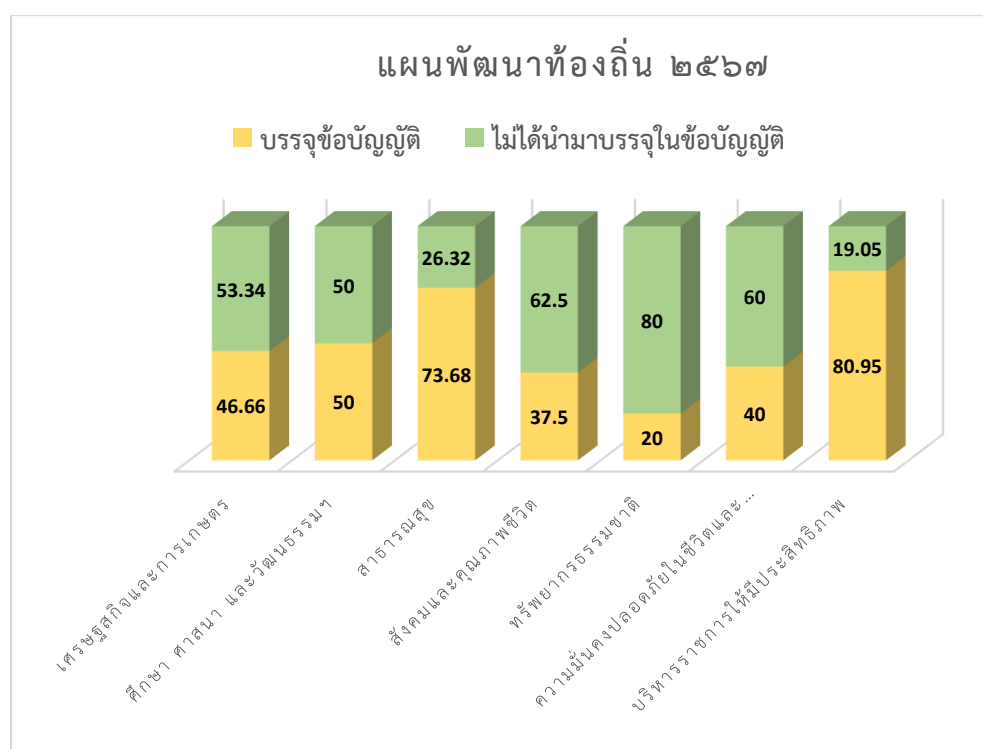

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๗

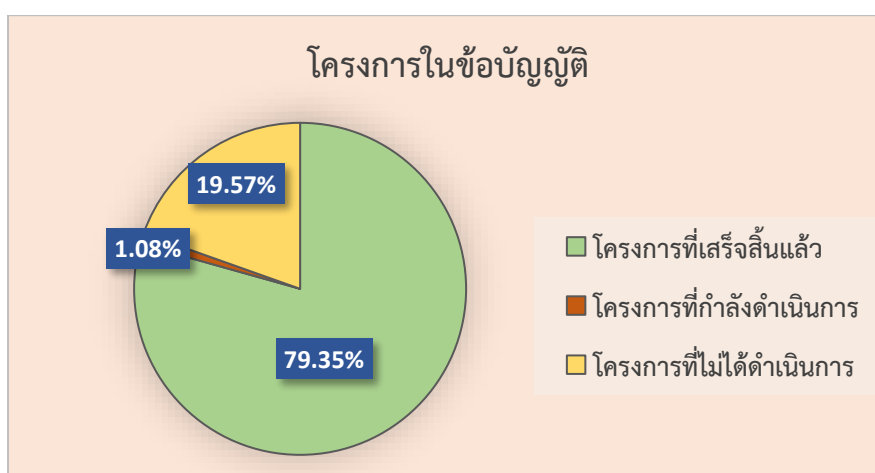

โครงการในข้อบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๕ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเลขที่ ๗๒ - ทุ่งนา (แยก ศาลาประชาคมไปทุ่งนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๗๒,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ ๓ จากหน้า บ้านผู้ใหญ่ไปบ้านโนนรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๖๓,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๓ ช่วงบนจากลาดยางขึ้นไป ด้านบน (ซอยประปา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ จาก บ้านนาย ประยูร จันทร์ ลอยถึงบ้าน นายเล็ง ประพันธ์ศรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ สายบ้าน ภูดินทองไปแยก ทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ ที่ ๒๑ – แยก ทช.นม.๔๐๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อย กว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖จากถนน คสล.เดิม เชื่อมทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐ ๐ เมตร ยาว๑๗๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินโดย การลง หินคลุกผิวจราจร บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัด ถึงคลองส่งน้ำหนองข่า	ช่วงที่ ๑ . งานดินถมคันทางขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ช่วงที่ ๒. งาน ดินถมคันทาง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ช่วง ที่ ๓. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ช่วงที่ ๔. งาน ดินถมคันทาง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๐๔ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๐ ลบ. ม. งานลงหินคลุกผิว จราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม.	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน ทับรัก หมู่ที่ ๕ จากถนนสาย ทับรัก - หว ใหญ่	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย๔.เมตรยาว๖๐๐ เมตรสูง เฉลี่ย๐.๕๐เมตรปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ลูกบาศ์ เมตร งานลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗เมตร หรือมี พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ตร.ม.	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาย อำนาจ นิตโรสง ถึง บ้านสมาน อุบล ผื่อน	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตรหนา ๐.๐๗ เมตรวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บ้านเมืองยางหมู่ที่๑๐	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่า เซลล์ บริเวณจุดเสี ยงสาม แยก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฎิรูปที่ดิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ชุดโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด	๙๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกร รีต บ้านโคก เพชร หมู่ที่ ๔ สาย รุ่งเรือง -คุ้มสวรรค์	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายรอบ บ้านเป็นแอสฟัลท์ติก บ้านหนองหัว หมูที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่๑กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการ เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนอง หัวบุงรพา หมู่ที่ ๒๐	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดย การลงหิน คลุกผิวจราจรบ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนาย อนันต์ จันทร์นวงค์ -สระ โสก หิน	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ช่วงที่๑.งานดินถมคัน ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.สูงเฉลี่ย ๑ ม. ช่วงที่ ๒.งาน ดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูง เฉลี่ย ๑.๖๐ ม.ช่วงที่ ๓.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๔. งานดินถมคัน ทางขนาด กว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๗๕ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. ปริมาณ ดินถมไม่ น้อยกว่า ๓,๗๗๐ ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตรม.	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		✓		กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหิน คลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ เลียบคลอง อีสานเขียว	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทาง ร่วม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ทาง หลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านเมืองยาง หมู่ ที่ ๑๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทาง รวม บ้านหนองหว้า บวรพา หมู่ที่ ๒๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๗	โครงการชุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ขนาดปากบ่อไม่น้อย กว่า ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V. AC พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาหมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๙	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน	ดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗
๓๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ก.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอม มะลิ บ้านหนองหว้าบวรพา หมู่ที่ ๒๐	สนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ในการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์หอม มะลิพันธุ์ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการขุดขยายสระหนองขุ่น บ้านหนอง สะแก หมู่ที่ ๑๔	งานดินขุดขนาดปากบนกวาง ๒๐.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๘,๕๒๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้ เรียบร้อยติดตั่งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๓	โครงการขุดลอก/ขยายสระ สนาม รองรับประปาใต้ดิน บ้าน โนนหาด หมู่ที่ ๖	งานดินขุด ขนาดปากบนกวาง ๒๒.๐๐ เมตรยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตรพร้อมดินขุดปรับแต่งคันคู สระ เดิมโดยรอบปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อยติดตั่งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๔	โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้าน หนองโก หมู่ที่ ๑๘	งานขุดลอกขนาดปากบนกวาง ๕๐.๐๐ เมตรยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตรปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๔,๕๙๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินคูสระให้เรียบร้อย	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๕	โครงการขุดลอกหนองใหม่บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	งานดินขุดลอกขนาดปากบนกวาง ๓๕.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตรพร้อมดินขุด ปรับแต่งคันคูสระเดิมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๓๕.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อย ติดตั่งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๓๖	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยา เสพติด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๑๕	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๓๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๘๓๒	มี.ค.๖๗	✓			กองศึกษา	มี.ค.๖๗
๓๘	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์ เด็ก	ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗
๓๙	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๑๘๐	พ.ย.๖๖-มี.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๖-มี.ค. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.โครงการอาหารกลางวัน ๒. ค่าวัสดุการศึกษา ๓.ค่า หนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗.โครงการวัน วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ฯลฯ ๘.โครงการทันตอนามัย ๙.โครงการศูนย์สะอาดอาหารปลอดภัย	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๓,๑๒๑	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง	๓,๗๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๓,๕๐๗,๙๘๔	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๗๓๑	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗	✓			กองศึกษา	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗
๔๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๖๓	พ.ย.๖๖	✓			กองศึกษา	พ.ย.๖๖
๔๔	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๒๘๐	เม.ย.๖๗	✓			กองศึกษา	๑๔ เม.ย.๖๗
๔๕	โครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๗	✓			กองศึกษา	๒๑ .ก.ค.๖๗
๔๖	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค	ดำเนินโครงการโดยการตรวจสอบน้ำ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๒๙.๓๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๘	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒๐,๐๐๐	๘๐๕	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๔๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๗	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๒	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕๑	จัดซื้อ วัสดุ/วัสดุ การแพทย์ และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และ เวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ส.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒	โครงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่า หมอกควัน	ดำเนินโครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟ ป่าหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๖,๕๐๔	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗
๕๓	โครงการดำเนินการเพื่อส่งเสริม การ ผลิต การบริโภค และการบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ การ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ส.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๕๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพการ ป้องกัน และ ควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการ รับมือ โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และ ควบคุม โรคต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการ รับมือโรคติดต่อโรค อุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๕๕	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๕๖	โครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค	ดำเนินโครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนใน การ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-เม.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๕๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๕๘	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการเพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างบ่อทิ้งปฏิกูลของตำบล โนนรัง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างคอนกรีตครอบปากบ่อ พร้อมตะแกรงเหล็กปิดปากบ่อ ขนาดกว้าง ๑๒*๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๖๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษา ดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	
๖๑	โครงการส่งเสริม และ พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๕๙๗	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗
๖๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษา ดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ส.ค. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๕๐	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	ม.ค.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใน ตามช่องทางสื่อต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	
๖๖	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่อยอดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่อยอดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย. ๖๗			✓	กองสวัสดิการ	
๖๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค. ๖๖	✓			กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๖-ธ.ค. ๖๖
๖๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			กองสวัสดิการ	มิ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗
๖๙	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๗,๗๕๐	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗
๗๐	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	๓๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๗-ส.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๗๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๗๒	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๗๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)	จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๓๒๘	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗ เม.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗ เม.ย.๖๗
๗๔	โครงการขับเคลื่อนลดภัยไข้ใจภู จราจร	ดำเนินโครงการขับเคลื่อนลดภัยไข้ใจภู จราจร	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๔๐	พ.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๗๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๗๒.๕๐	ม.ค.๖๗-พ.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-พ.ค. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๘๔	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗
๗๗	โครงการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน	ดำเนินโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัย ทางถนน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อพพร.	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอพพร.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๗๙	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ อบต.	ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ก.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด	ก.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗
๘๐	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๘๖๓	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	๘,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๘๒	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำรู้แก่ผู้นำ ชุมชน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายนำรู้แก่ผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๕๔	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-ก.ค. ๖๗
๘๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก สภา อบต.ผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และ สมาชิก สภา อบต.ผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๑๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ม.ค. ๖๗
๘๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗			✓	สำนักปลัด	
๘๕	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	๒,๓๘๕	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่	ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๓๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๙๒๕	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๘	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ก.ย. ๖๗
๘๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองคลัง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			กองคลัง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗
๙๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายใน สำนักงานโดยการเพิ่มปีกเสา พาด สาย ผู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงาน โดยการ เพิ่มปีกเสา พาดสาย ผู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	๒๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗			✓	สำนักปลัด	
๙๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗


สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๕,๔๕๖,๐๐๐	๒๖	๑	—	—	๕,๒๐๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๗	๑,๓๓๔,๐๐๐	๕	—	๒	—	๑,๑๙๐,๕๐๐	๑๔๓,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๕,๘๐๕,๐๐๐	๑๐	—	—	—	๕,๓๔๖,๗๐๖	๔๕๘,๒๙๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๑,๑๙๐,๐๐๐	๘	—	๖	—	๘๔๙,๙๒๗	๓๔๐,๐๗๓
๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๙	๘๑๗,๐๐๐	๕	—	๔	—	๘๓,๘๔๗	๗๓๓,๑๕๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐	๑	—	๓	—	๗,๗๕๐	๑๐๒,๒๕๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	—	—	—	๔๑๗,๗๙๒	๑๐๒,๒๐๘
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๔	๑,๓๓๓,๐๐๐	๑๑	—	๓	—	๗๙๑,๗๗๗	๕๔๑,๒๒๓
รวม	๙๒	๑๖,๕๖๕,๐๐๐	๗๓	๑	๑๘	๐	๑๓,๘๙๑,๒๙๙	๒,๖๗๓,๗๐๑

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๔๙ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๘ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๒,๒๗๓,๐๐๐บาท แผนงานการศึกษา ๘๑๗,๐๐๐ บาท แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๓๐,๐๐๐บาท

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗

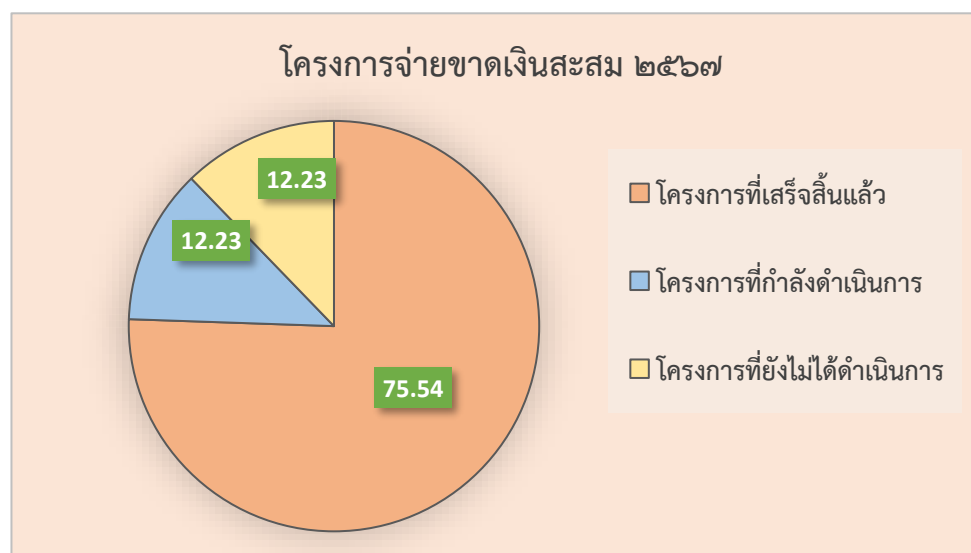

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๙ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๔ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่ แยกศาลาประชาคมถึงสามแยกต้นมะขาม ใหญ่ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๖๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรังกำหนด	๒๕๕,๐๐๐	✓				๒๓๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนรัง หมู่ ที่ ๑ ถนนสายซอยข้างวัดโนนรัง – สามแยก บ้านนายศักดิ์	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรังกำหนด	๒๑๐,๐๐๐	✓				๒๐๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อม ท่อพักจากบ้านนายคำ พิลาศรี บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองหว้าบุรพา หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร วางท่อ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๖๕,๐๐๐			✓		-	๒๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวินัย เอี่ยมสุวรรณ บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรังกำหนด	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๕๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน นางตุ๊กตา กลั่นเพชรพะเนาว์ - ลาดยางหน้า บ้านนายกุศล เทือกทอง บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๙๔,๐๐๐	✓				๓๙๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถัง ประปาแบบแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลบ.ม.รวมติดตั้ง อุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังท่อถังเหล็กพร้อม ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์สปั้ม) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมท่อดูดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	✓				๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางก้อม มงคล ถึงถนนสายศาลปู่ ตา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๘๙,๐๐๐	✓				๓๘๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิว จราจรรอบสนามกีฬา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ช่วง ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิว จราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรังกำหนด	๗๘,๐๐๐	✓				๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ – คุ่มโปรง เจริญ	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนน รังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงกลมแป้น บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถังประปาแบบกลม แป้น ขนาด ๑๕ ลบ.ม.รวมติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิดจากปาก บ่อไปยังท่อถังหลักพร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๕๐,๐๐๐	✓				๓๒๒,๓๔๖	๒๗,๖๕๔	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติก-คอนกรีต จากสาม แยกบ้านเมืองยางถึงบ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๓๐๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวไซ ถึงนา นายสัจด์ บ้านโนน หาด หมู่ที่ ๖	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	✓				๔๔๕,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับ ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	งานซ่อมแซมท่อถังสูงประปาเดิม งานติดตั้งชุดเครื่องสูบ น้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (ซัมเมอร์สปั้ม) ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์พร้อมต่อเชื่อมกับ ระบบประปาเดิม วางท่อจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๕๕,๐๐๐	✓				๑๓๒,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๙๐,๐๐๐	✓				๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ทข.นม.๔๐๔๗ - โรงงาน SCG บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนน รังกำหนด	๑๖๗,๐๐๐	✓				๑๖๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงคันคูคลองโดยการลงหิน คลุกผิวทางจราจร บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ สายเลียบบคลองหนองข่า - หนองเมืองรัง	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐	✓				๒๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายบุญมี บุญเศษ บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๘	ปริมาณงานงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๒๕,๐๐๐	✓				๒๒๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๙๐,๐๐๐	✓				๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ แบบโซล่าเซลล์ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อไม่น้อย กว่า ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ชุด เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบมอเตอร์จรมได้น้ำโซล่าเซลล์ ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	✓				๒๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปาจาก ประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองหัวบุงรพา หมู่ ที่ ๒๐ - บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน งานปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี เดิม ขนาด Ø ๔ นิ้ว หนา ๘.๕ ชั้น ยาวรวม ๖๕๐ เมตร งานติดตั้งปั้มน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒ V จำนวน ๑ เครื่อง ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนน รังกำหนด	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่ แยกบ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ (เส้นปู่ตา)	ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๕.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๓๓,๐๐๐		✓			๔๐๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ไปศาลปู่ตา บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๙๔,๐๐๐	✓				๓๗๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้า ศพด. บ้านดงบัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จากสี่แยกบ้าน นายสุพล พรหมโพธิ์ เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๓๖,๐๐๐	✓				๔๓๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๖	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๙๐,๐๐๐	✓				๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาด้วยการย้าย ถังและเพิ่มความสูง จากชอย ๓ ไปชอย ๑ หนองตาลิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน งานก่อสร้างฐานรากหอดึงประปาแบบ เซมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม.งานย้ายพร้อมติดตั้งใหม่และ ต่อเติมความสูงหอดึงเหล็กรูปเซมเปญเดิม สูงเพิ่ม ๖.๐๐ เมตร ชุดเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบมอเตอร์จมน้ำ โซล่า เซลล์ ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ พร้อมรวมติดตั้งอุปกรณ์ทุก ชนิดจากปากบ่อไปยังหอดึงเหล็ก วางท่อประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๓๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อ กับระบบประปาเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๕๐,๐๐๐		✓			๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ๑๙๕- ๐๑ บ้านใหม่พัฒนา - โรงสับไม้ SCG - แยก ทช.นม.๔๐๔๗	ปริมาณงาน งานซ่อมแซมถนนด้วยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๐๐,๐๐๐		✓			๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากแยก บ้านนายสมจิตร - สี่แยกกลางบ้านหนอง สะแก หมู่ที่ ๑๔	ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๙๒,๐๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมถัง หมู่บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มหนอง สะแก)	ปริมาณงาน งานซ่อมแซมหอดึงสูงประปาเดิม , งาน เปลี่ยนถังเก็บน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตรจำนวน ๔ ใบพร้อม ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ต่อจาก คสล.เดิม ไปถนน ทล.๒๐๗๓ หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง ท่อให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๐,๐๐๐	✓				๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ จากสี่แยกไปบ้านนายสมาน ทะกาเรนะ	ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๓๒,๐๐๐		✓			๔๐๙,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ปริมาณงาน งานซ่อมแซมหม้อถังสูงประปาเดิม พร้อมติดตั้ง ชุดเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบมอเตอร์จรมไต้โซล่าเซลล์ ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ ต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	✓				๕๓,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	✓				๑๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร จากคลองอีสานเขียว ถึงถนนลาดยาง บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๗๙,๐๐๐	✓				๖๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๗	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ ต่อจากเดิม(ถนน รอบหมู่บ้าน)	ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๗๙,๐๐๐	✓				๔๖๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคุณถึงถนนลาดยาง บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๙๑,๐๐๐	✓				๘๓,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางไธ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๑๕๕,๐๐๐	✓				๑๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิว จราจร บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนาย คำดี ร่วมสุข - เหวใหญ่	ปริมาณงาน งานดินถมคันทางพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร. ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๘๔,๐๐๐	✓				๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างฝาดัดเหล็กรางระบายน้ำ บ้านหนองหัวบурพา หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน งานติดตั้งฝาดัดเหล็กรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร พร้อม ทำความสะอาดรางระบายน้ำให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๐๕,๐๐๐			✓		-	๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๓	โครงการปรับปรุงคันคูห้วยยางโดยการลง หินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองหัวบурพา หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๕ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๗๒,๐๐๐			✓		-	๓๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ - บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ .๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๔๙๒,๐๐๐		✓			๔๘๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมต้นรัง ๒ , กองสวัสดิการสังคม	ปริมาณงาน งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิม พร้อม มุงหลังคาใหม่ ด้วยวัสดุเมทัลชีท ขนาดอาคาร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๖	โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมกลุ่มอาชีพ OTOP	ปริมาณงาน งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น เดียว ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๐๐,๐๐๐		✓			-	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๔๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนรัง	ปริมาณงานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิม พร้อม ยกระดับหลังคาใหม่ มุงด้วยวัสดุเมทัลชีท ขนาดอาคาร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๗๐๐,๐๐๐			✓		-	๗๐๐,๐๐๐	กองศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๘	โครงการจัดซื้อผ้าเตนท์ จำนวน ๖ ชุด	ปริมาณงานจัดซื้อผ้าเตนท์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด ผ้าเตนท์ผลิตจาก ผ้าคูนิลอน เคลือบด้วย พีวีซี ความหนาของผ้าไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๑๐๕,๐๐๐	✓				๑๐๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	เพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนรัง ราคาที่กำหนดเป็นราคาพร้อมติดตั้ง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	๕๘,๕๐๐			✓		-	๕๘,๕๐๐	กองศึกษา

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๔. การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัตถุประสงค์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (ต่อ)	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔
๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่ การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔
๕.๔ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๓

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕
	๙) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน (ต่อ)	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่พัฒนา

ภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมา มีแผนงานที่สามารถบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติจำนวนมากทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ รวม ๙๒ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น ๑๖,๕๖๕,๐๐๐ ล้านบาท โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๔๙ โครงการเป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๒,๒๗๓,๐๐๐บาท แผนงานการศึกษา ๘๑๗,๐๐๐ บาท แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังสามารถดำเนินการโครงการแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติให้เสร็จสิ้น จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖% ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมดโดยโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการนั้น เป็นโครงการที่ตั้งไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และบางโครงการตั้งไว้ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๙ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๔ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตามสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนที่มีการลงหินคลุก โดยมีการคมนาคม การสัญจรที่สะดวกขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓. มีการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมการขุดลอกลำห้วย หนองสาธารณะประโยชน์ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้กักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
๔. มีการปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการป้องกันควบคุมโรคในสถานการณแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ควรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของถนน เนื่องจากมีถนนบางเส้นที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นได้ไม่นานแต่เกิดการสึกหลอของผิวถนน

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่เสนอเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีรายละเอียดงาน กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานของโครงการนั้นๆให้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักการ
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางหมู่บ้านนั้นยังไม่ครอบคลุมและไม่มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญด้านการจัดทำแผนให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ควรมีแผนในการจัดซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น มีแผนซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละหมู่บ้าน มีแผนการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีงบประมาณที่เพียงพอในการแก้ปัญหานั้นๆ เป็นต้น
๔. ควรให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจัดทำโครงการที่ช่วยพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนับสนุนด้านกรประกอบอาชีพ ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
๕. โครงการต่างๆที่บรรจุลงในข้อบัญญัติ หรือโครงการการจ่ายเงินสะสม ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้ ในกรณีที่บางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ควรพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหาของโครงการนั้นๆว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้

ลงชื่อ วัฒนา ชันแข็ง ผู้รายงาน
(นายวัฒนา ชันแข็ง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
